


ご報告事項について

目 次

(1) BSL-4 施設建設工事の状況について	3
(2) 令和3年度予算（案）における長崎大学のBSL4施設に関連する経費 の計上について	7

B S L - 4 施設実験棟新営工事スケジュール（2021年2月現在）

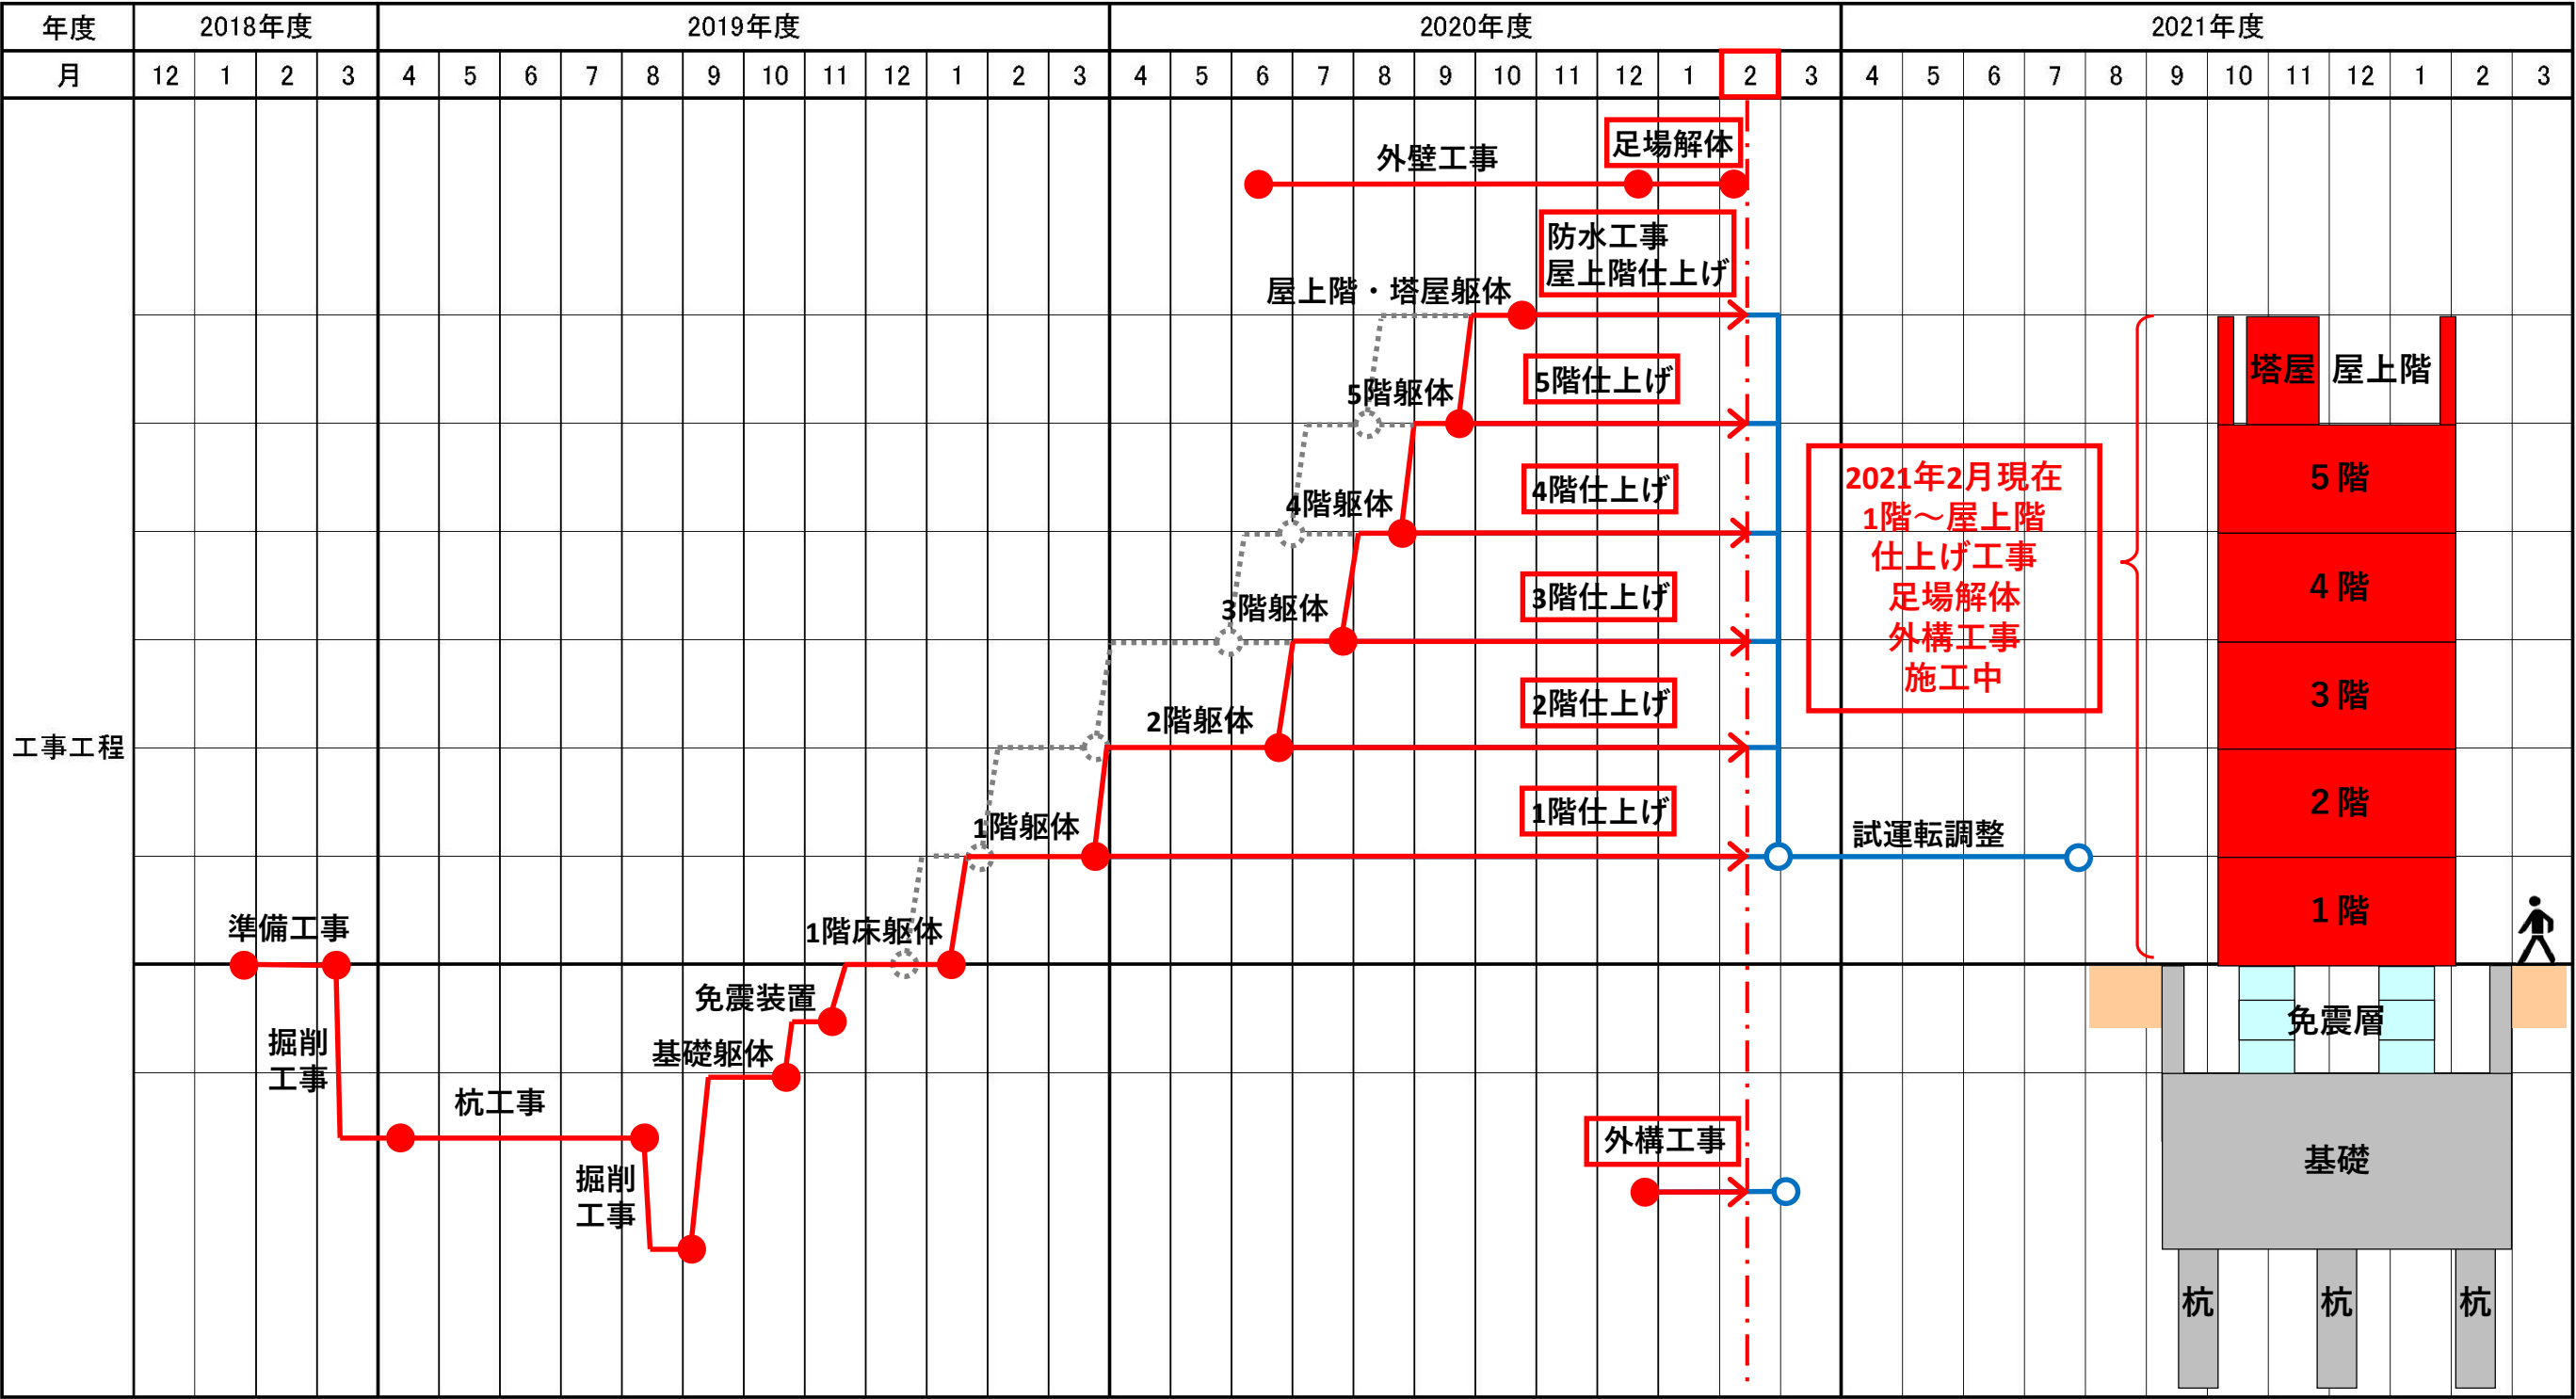

【備考】

躯体工事：柱や梁、床などの建物の骨組みを作る工事
本建物は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）のため、以下の流れで行う。
①鉄筋を組む ②コンクリートを流し入れる型枠を建てる ③コンクリートを流し込む（打設）
「1階躯体」は1階の柱、壁、天井（2階の床）のコンクリートを作る工事を示す。
仕上げ工事：各階の内装工事（ボード張りや塗装など）及び設備工事（電気設備、空調設備など）を示す。
外構工事：建物の外回りの工事（フェンス設置、舗装など）を示す。
塔屋：エレベーターの機械室などで屋上に突き出した部分を示す。

- 当初工程
- 実績工程
- 予定工程



施工状況全景（1/6撮影）



施工状況全景（1/29撮影）



施工状況全景（1/6撮影）




施工状況全景（1/26撮影）




内装工事施工状況（1/27撮影）



内装工事施工状況（1/26撮影）

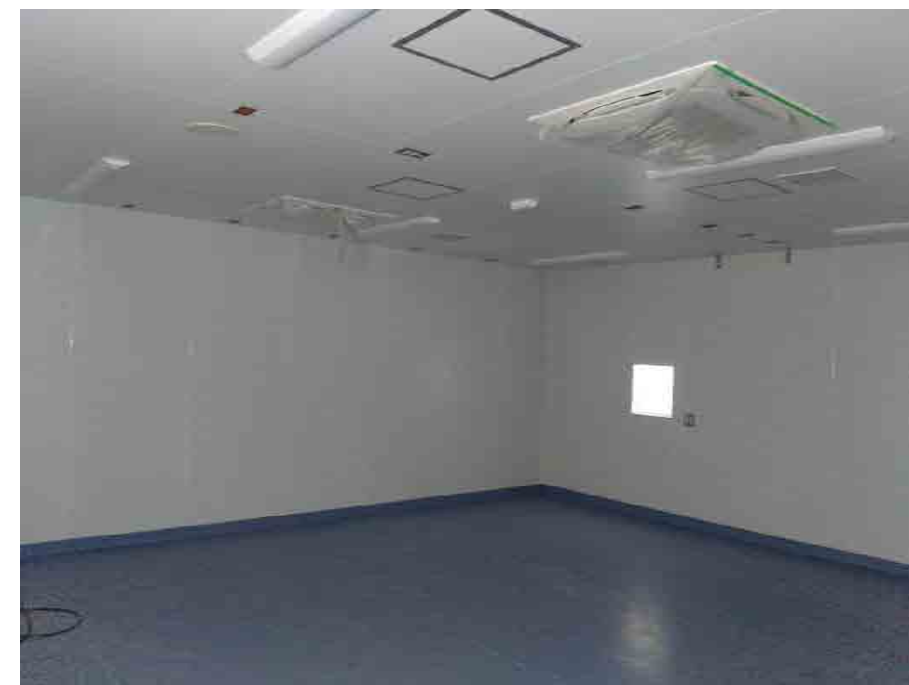

内装工事施工状況（1/26撮影）

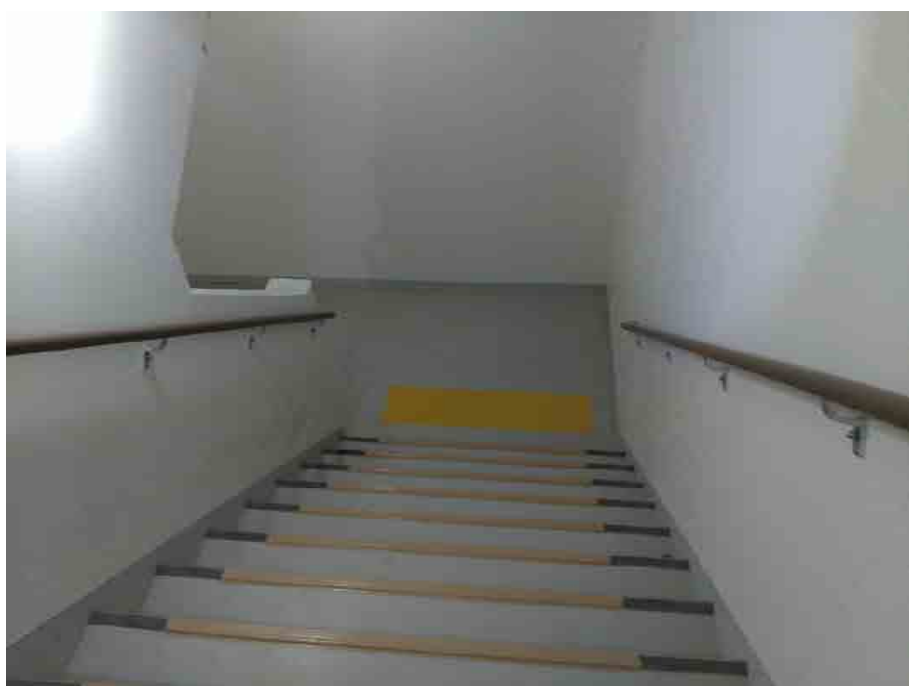

内装工事施工状況（1/26撮影）



設備工事施工状況（1/21撮影）



設備工事施工状況（1/21撮影）



足場解体施工状況（1/12撮影）



クレーン解体施工状況（1/20撮影）



外構工事施工状況（1/21撮影）



外構工事施工状況（1/22撮影）



外構工事施工状況（1/25撮影）



外構工事施工状況（1/25撮影）

**令和3年度予算（案）における長崎大学のBSL4施設に関連する経費
の計上について**

○ 長崎大学のBSL4施設を中核とした感染症研究拠点の形成に係る経費 約22億8千万円

（内訳）

- ・ 新興・再興感染症研究基盤創生事業の内 約19億6千万円
（研究支援（研究に必要な設備の整備（約17億6千万円））含む）
- ・ 国立大学法人運営費交付金の内 約3億2千万円
（世界をリードする感染症教育研究拠点の形成に係る人件費等）

**令和2年度第3次補正予算（案）における長崎大学のBSL4施設に
関連する経費の計上について**

○ 長崎大学教育研究棟（感染症共同研究拠点）の整備に係る経費 630億円の内数
