


## ご報告事項について

### 目次

(1) 建設工事の状況について .....	3
(2) 平成30年度「長崎大学のBSL4施設を中核とする感染症研究拠点の形成に係る経費」の実績について .....	9



# 長崎大学（坂本1）実験研究棟新築工事スケジュール（2019年7月現在）

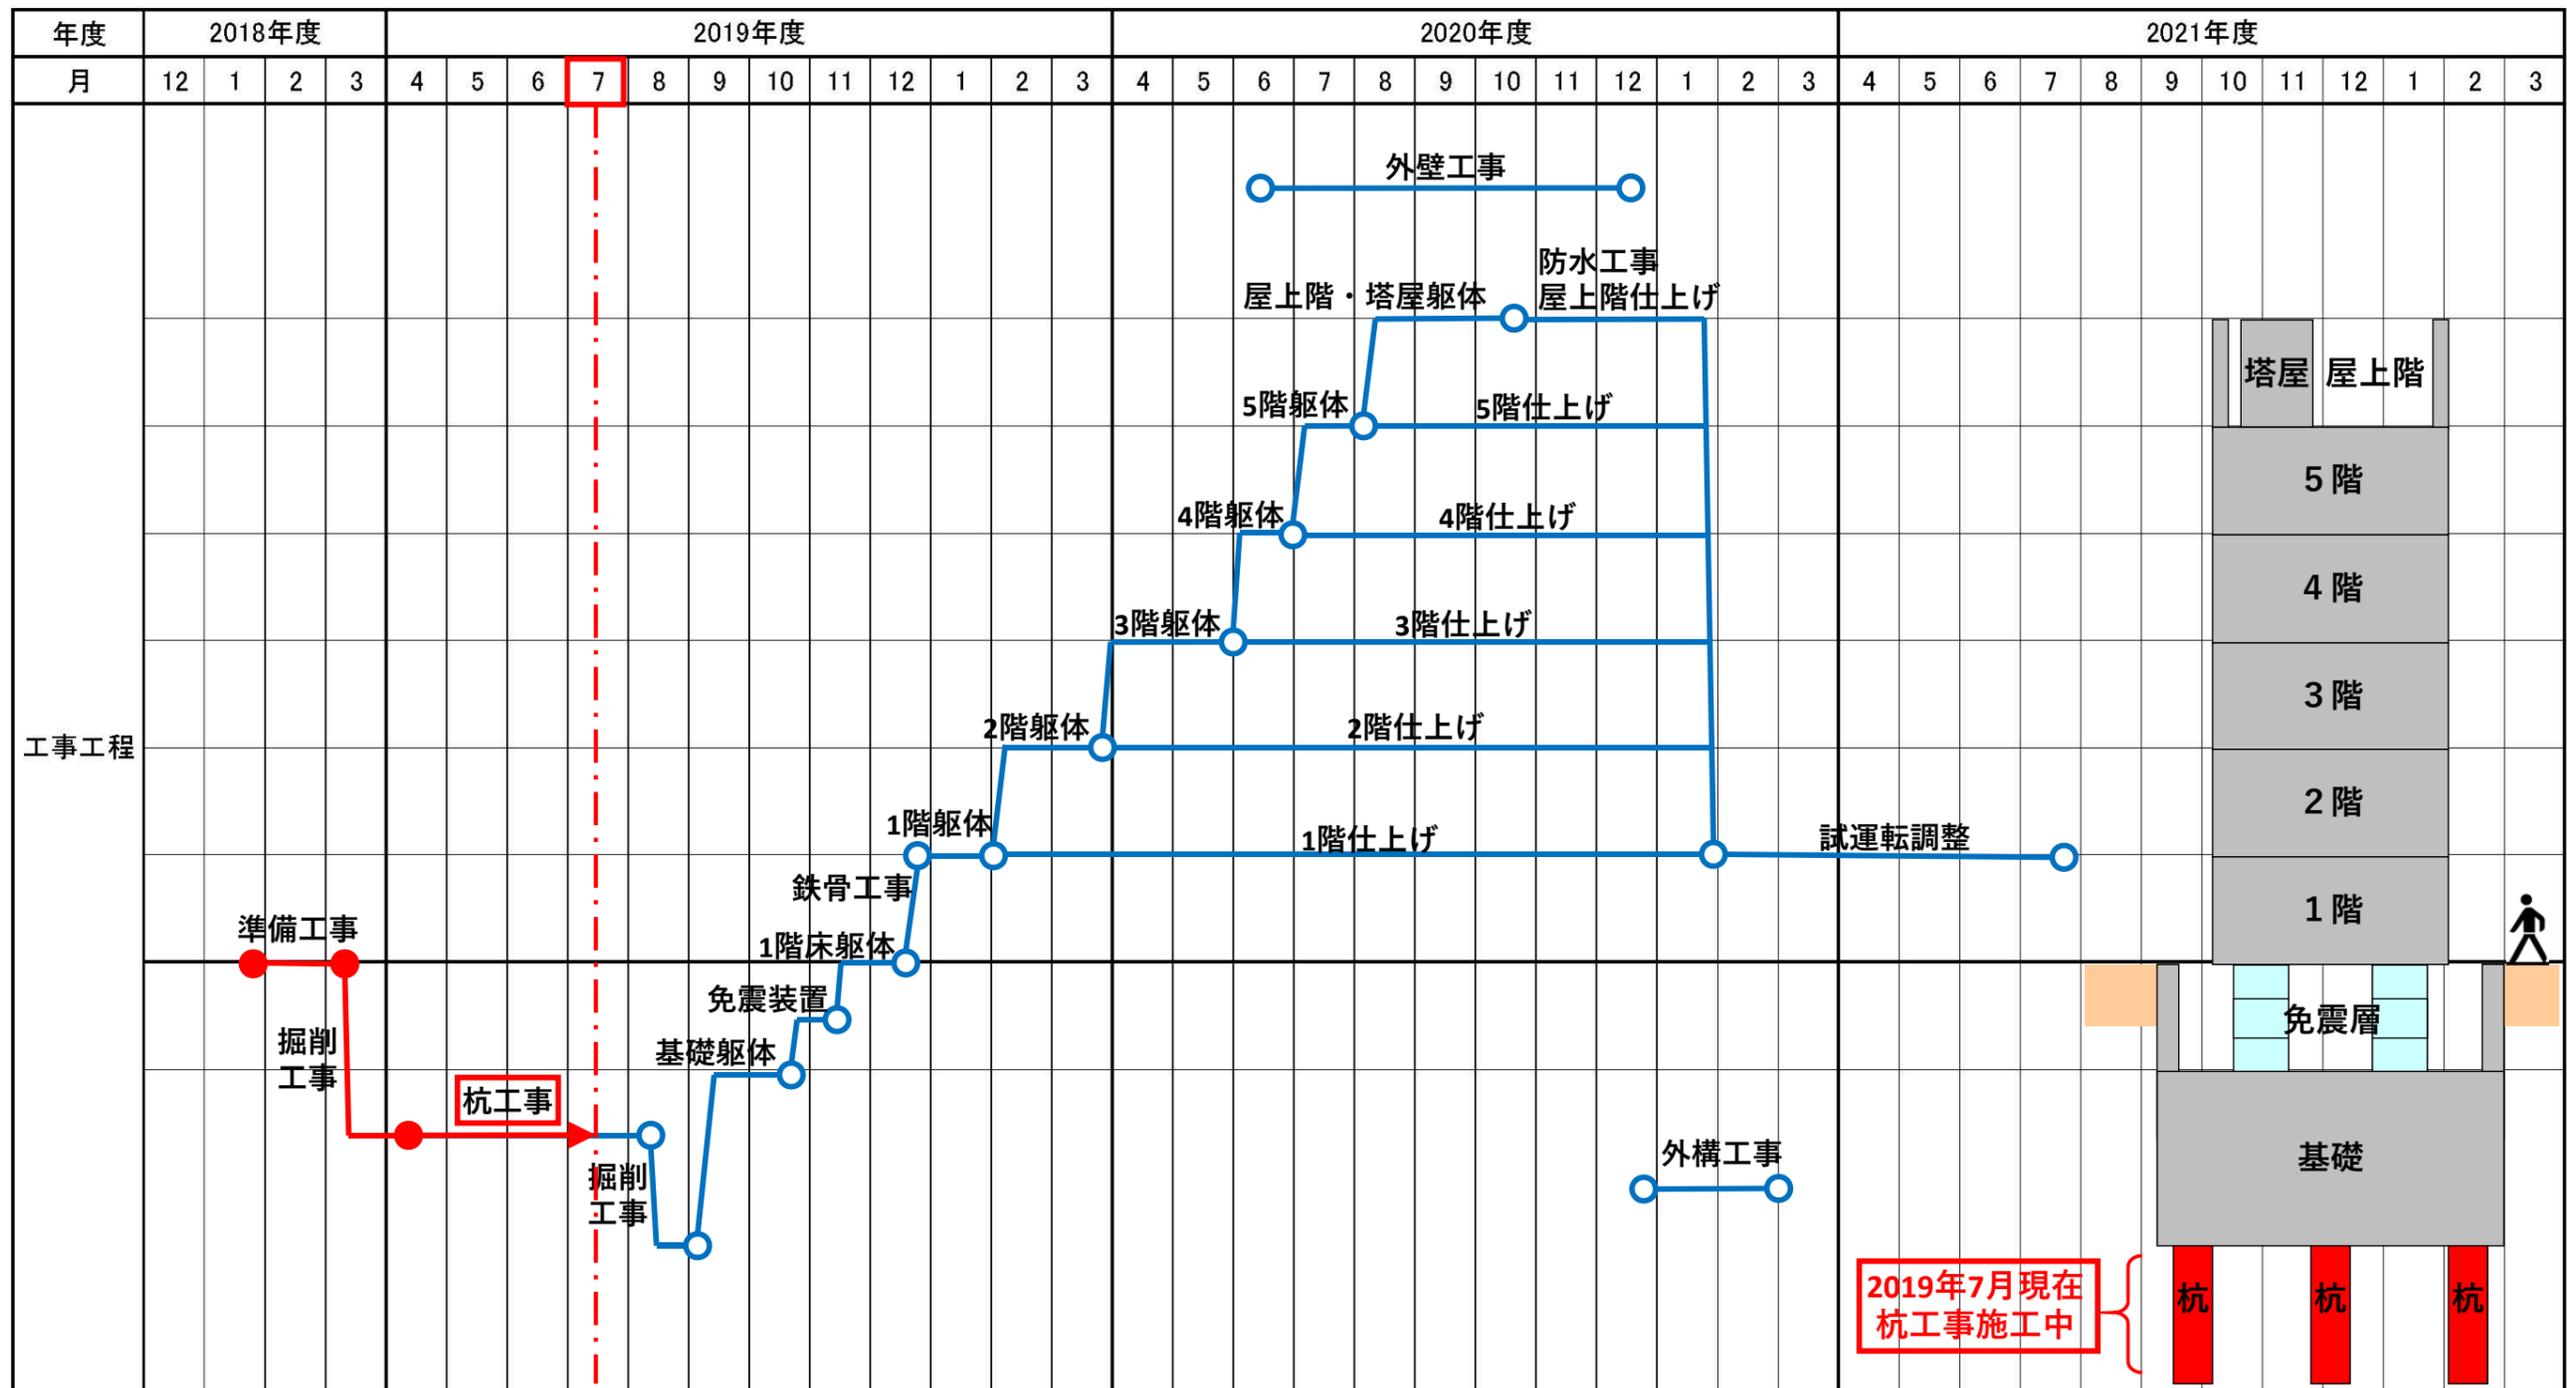

## 【備考】

躯体工事：柱や梁、床などの建物の骨組みを作る工事

本建物は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）のため、以下の流れで行う。

①鉄筋を組む ②コンクリートを流し入れる型枠を建てる ③コンクリートを流し込む（打設）

「1階躯体」は1階の柱、壁、天井（2階の床）のコンクリートを作る工事を示す。

仕上げ工事：各階の内装工事（ボード張りや塗装など）及び設備工事（電気設備、空調設備など）を示す。

外構工事：建物の外回りの工事（フェンス設置、舗装など）を示す。

塔屋：エレベーターの機械室などで屋上に突き出した部分を示す。

長崎大学（坂本1）実験研究棟新営工事  
進捗状況報告（2019年7月現在）



杭工事施工状況（全景）



透明パネル設置（東面仮囲い）



杭工事施工状況（全景）



杭工事施工状況



杭工事施工状況

工事案内表示状況（2019年7月現在）

設置場所③（北側フェンス）

- ・工事案内
- ・騒音振動計

設置場所⑤（体育館裏）

- ・工事案内
- ※ブロック塀の撤去を予定しているため撤去後に設置予定（2019年10月頃）

設置場所④（旧正門）

- ・工事案内

BSL-4施設  
建設現場

設置場所②（北門）

- ・工事案内
- ・週間予定
- ・騒音振動計

設置場所①（正門）

- ・工事案内
- ・週間予定



騒音振動計（2か所）  
（幅90cm×高さ180cm）

国立大学法人長崎大学

**ご迷惑をお掛けしております**  
**感染症共同研究拠点実験棟の**  
**工事を行っています。**

工事期間  
**2021年7月末まで**

作業時間  
**原則 8:00~17:00**

工事場所  
現在地

発注者 国立大学法人 長崎大学 ☎095-819-2970  
施工者 戸田建設株式会社 ☎095-894-9050

工事案内（4か所）  
（幅80cm×高さ110cm）

**ご近隣の皆様へ**

工事名 長崎大学(坂本1)実験研究棟新営工事  
今週の作業予定

月	
火	
水	
木	
金	
土	
日	

工事の騒音・振動等についてお気付の点は下記までご連絡下さい。

戸田建設 TEL 095-894-9050  
長崎大学施設部 TEL 095-819-2970

週間予定（2か所）  
（幅60cm×高さ90cm）

# 工事案内表示状況（2019年7月現在）



設置場所①（正門）  
（工事案内、週間予定）



設置場所②（北門）  
（工事案内、週間予定、騒音振動計）



設置場所③（北側フェンス）  
（工事案内、騒音振動計）



設置場所④（旧正門）  
（工事案内）

# 工事案内表示変更

180cm

**感染症共同研究拠点実験棟建設工事のご案内**

国立大学法人長崎大学

**ご近隣の皆様へ**

工事名 長崎大学(坂本1)実験研究棟新営工事  
今週の作業予定

月	火	水	木	金	土	日

工事の騒音・振動等についてお気付の点は下記までご連絡下さい。

戸田建設 TEL 095-894-9050  
長崎大学施設部 TEL 095-819-2970

ご迷惑をお掛けしております

**感染症共同研究拠点実験棟の  
工事を行っています。**

工事期間

**2021年7月末まで**

作業時間

**原則 8:00~17:00**

工事場所 ● 現在地

発注者 国立大学法人 長崎大学 ☎095-819-2970  
施工者 戸田建設株式会社 ☎095-894-9050

● 案内表示A

270cm

**感染症共同研究拠点実験棟建設工事のご案内**

国立大学法人長崎大学

**ご近隣の皆様へ**

工事名 長崎大学(坂本1)実験研究棟新営工事  
今週の作業予定

月	火	水	木	金	土	日

工事の騒音・振動等についてお気付の点は下記までご連絡下さい。

戸田建設 TEL 095-894-9050  
長崎大学施設部 TEL 095-819-2970

ご迷惑をお掛けしております

**感染症共同研究拠点実験棟の  
工事を行っています。**

工事期間

**2021年7月末まで**

作業時間

**原則 8:00~17:00**

工事場所 ● 現在地

発注者 国立大学法人 長崎大学 ☎095-819-2970  
施工者 戸田建設株式会社 ☎095-894-9050

● 案内表示B

80cm

国立大学法人長崎大学

ご迷惑をお掛けしております

**感染症共同研究拠点実験棟の  
工事を行っています。**

工事期間

**2021年7月末まで**

作業時間

**原則 8:00~17:00**

工事場所 ● 現在地

発注者 国立大学法人 長崎大学 ☎095-819-2970  
施工者 戸田建設株式会社 ☎095-894-9050

110cm

● 案内表示C

案内表示B (北側フェンス)

案内表示C (体育館裏) ※2019年10月～

案内表示B (北門)

案内表示C (旧正門)

案内表示A (正門)

- 7 -

# 工事案内表示変更



設置場所①（正門）  
（案内表示A）



設置場所②（北門）  
（案内表示B）



設置場所③（北側フェンス）  
（案内表示B）



設置場所④（旧正門）  
（案内表示C）

平成 30 年度「長崎大学の B S L 4 施設を中核とする  
感染症研究拠点の形成に係る経費」の実績について

○平成 30 年度 BSL4 施設を中核とする感染症研究拠点の形成に係る予算額：

約 12 億 8 千万円

(うち、施設設備の整備に係る予算額：

約 10 億 0 千万円)

【内訳】

・感染症研究革新イニシアティブ（J-PRIDE）の内  
(実績（支出項目等）)

約 10 億 8 千万円

(単位：千円)

研究費	物品費（研究設備の整備費等） (内訳)	
	・消耗品費（20,479 千円） ※研究で用いる試料、試薬等	
	・工具機器・備品費（10,987 千円） ※研究機器（細胞生物学向け 3 次元可視化・解析ソフトウェア、マニュアルピペッター等）	
	・図書費（8,118 千円） ※電子ジャーナル経費	
	・賃借料（1,213 千円） ※学内研究室の賃借料	
	・その他（188 千円） ※電気費、会議費等	40,985
	人件費	24,626
	業務委託費（分担機関への研究委託費等）	29,640
旅費その他 (内訳)	・職員旅費（4,204 千円） ※国内・海外出張旅費	
	・その他（545 千円） ※研究機器点検費、学会参加費等	4,749
	小計	100,000
施設整備費		0

※施設整備費に係る予算（9 億 8 千万円）については令和元年度に繰越

- ・国立大学法人施設整備費補助金の内 約2千万円  
(実績(支出項目等)) (単位:千円)

施設整備費	24,860
-------	--------

- ・国立大学法人運営費交付金の内 約1億8千万円  
(実績(支出項目等)) (単位:千円)

人件費	95,218
運営・研究経費 (内訳)	
・工具機器・備品費(38,622千円) ※研究機器(共焦点レーザー顕微鏡、マイクロプレートリーダー (蛍光反応等の測定機器)等)	
・業務委託費(10,278千円) ※同時通訳、テープ起こし、HP保守等委託費	
・消耗品費(9,007千円) ※事務機器(PC、机等)、事務用品(コピー用紙、文具等)費	
・職員旅費(7,150千円) ※国内・海外出張旅費	
・広告宣伝費(6,608千円) ※リーフレット作成・印刷、広告経費	
・報酬謝金費(4,628千円) ※諸会議委員の謝金等	
・印刷製本費(2,820千円) ※複合機(プリンター)リース料	
・建物付属設備(2,595千円) ※居室修繕等	
・その他(2,914千円) ※通信運搬費、光熱水料、図書費等	84,622
小計	179,840

※人件費は、教職員の業務実態等に応じ、感染症研究革新イニシアティブ、運営費交付金のそれぞれ又は双方から支出。感染症共同研究拠点教職員のうち18名の人件費の総計。
